



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 92 del 14/05/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI SAN GIMIGNANO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - CIG 637199509F - CUP C27B14000120004.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **16:30** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
GAROSI ILARIA	Assessore	Assente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
ANTONELLI MARCO	Assessore	Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI SAN GIMIGNANO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - CIG 637199509F - CUP C27B14000120004.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 25/02/2015 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la "Realizzazione Nuova Palestra di San Gimignano", per un importo complessivo di € 939.881,24 di cui € 899.391,29 per lavori base d'asta, € 40.489,95 per oneri della sicurezza ed € 170.118,76 quali somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione del Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici n. 596 del 30/12/2015 i lavori di "Realizzazione della Nuova Palestra di San Gimignano" sono stati affidati ad Impresa Edile D'Angeli Renato con sede legale ad Anagni (FR), Via Ponte Piano n. 1, P. IVA 00520620600 e C.F. DNGRT54E06A269I, iscritta presso la Camera di Commercio di Frosinone al n. 77525 del Registro delle Imprese, per l'importo di € 651.447,10 oltre ad oneri per la sicurezza per € 40.489,95 così per un totale di € 691.937,05 oltre I.V.A. nella misura di legge, avendo la stessa offerto un ribasso del 27,568 % sull'importo dei lavori da eseguire;
- con determinazione del Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici n. 258 del 31/05/2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- in data 15/03/2017, con atto a rogito del Segretario Comunale Dott.ssa Coppola rep. n. 1682, registrato in Poggibonsi il 16/03/2017 al n. 559 serie 1T, è stato sottoscritto il contratto d'appalto relativo all'esecuzione dei lavori suddetti;

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Passaniti, in data 10/11/2017, acquisito al protocollo informatico dell'Amministrazione Comunale al nr. 25766/2017, in conseguenza del quale la data per l'ultimazione dei lavori si è attestata al 4 aprile 2019 (n. 511 giorni naturali e consecutivi art.4 del citato contratto d'appalto);

Vista la certificazione di Inizio dei lavori redatta in data 5/12/2017 dal Direttore dei Lavori, ns. prot n.27083/2017;

Dato atto che, trattandosi di procedura di gara avviata precedentemente al 19.4.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto ricade nel previgente assetto normativo di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e D.P.R. 207/2010, così come precisato anche nella nota congiunta del 22.04.2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e del Presidente della Autorità nazionale anticorruzione - ANAC;

Rilevate:

- la sospensione dei lavori n.1, verbalizzata in data 11/12/2017;
- la ripresa dei lavori n.1, verbalizzata in data 25/01/2018;
- la successiva sospensione dei lavori n.2, verbalizzata in data 26/02/2018;
- la ripresa dei lavori n.2, verbalizzata in data 03/04/2018;
- la successiva sospensione dei lavori n.3, verbalizzata in data 13/02/2019;

Dato atto che a seguito delle sospensioni dei lavori precedenti a quella del 13/02/2019 , il termine di ultimazione dei lavori è spostato al 22/06/2019 e che tale data subirà un nuovo spostamento ad una data che sarà individuata nel momento della ripresa dei lavori;

Preso atto che :

- con deliberazione della Giunta Comunale n.105 del 11/07/2018 si è provveduto a:
 - a) approvare la proposta di perizia di variante e suppletiva n. 1 per i lavori di

“Realizzazione della Nuova Palestra di San Gimignano”, presentata dal Direttore dei lavori Ing. Giovanni Passaniti, ns. prot. n. 15208 del 04/07/2018,

b) finanziare i lavori suddetti per l'importo di € 98.562,82 oltre IVA (per un importo totale comprensivo di IVA pari ad € 108.419,10) attingendo la relativa cifra dalle somme a disposizione dell'Ente all'interno del Bilancio Comunale;

c) approvare il Quadro Economico – Piano dei Costi della Nuova Palestra del capoluogo, rideterminato dal RUP del procedimento, Arch. Alberto Sardelli, così da contenere le spese effettivamente sostenute nonché le risorse finanziarie disponibili per il completamento dell'opera pubblica, dando atto che l'importo complessivo indicato dal Quadro Economico è finanziato con somme a disposizione dell'Ente all'interno del Bilancio Comunale;

d) dare mandato al Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e L.L.P.P. Arch. Alberto Sardelli di adottare tutti i provvedimenti necessari a dare esecuzione a quanto disposto dal presente atto;

- con determinazione del Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici n. 439 del 20/08/2018 si è provveduto ad impegnare la somma di € 108.419,10 IVA compresa - a favore dell'Impresa Edile D'Angeli Renato con sede ad Anagni (FR), P. IVA 00520620600;

Vista la determinazione del Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici n. 805 del 31/12/2018 con la quale si è provveduto ad approvare il Quadro Economico – Piano dei Costi della Nuova Palestra di San Gimignano” rideterminato dal RUP del procedimento, Arch. Alberto Sardelli, così da contenere le spese effettivamente sostenute ad oggi nonché le risorse finanziarie disponibili per il completamento dell'opera pubblica anche alla luce delle recenti variazioni di bilancio;

Vista la proposta di perizia di variante n. 2 per i lavori di “Realizzazione della Nuova Palestra di San Gimignano”, presentata dal Direttore dei lavori Ing. Giovanni Passaniti affidatario del servizio di direzione lavori, ns. prot. n. 8975 del 3/05/2019, agli atti di questa Amministrazione Comunale;

Considerato che per quanto rilevato dalla suddetta perizia di variante ed in particolare dalla relazione tecnica cui si rimanda (in allegato al presente provvedimento sub lett. “A”), allo scopo di completare le opere appaltate in modo funzionale si ritiene indispensabile:

- la formazione di un sistema di drenaggio composto sia da alcuni “rami” di trincee drenanti che dalla formazione di uno strato di materiale arido (di circa 15 cm) da disporre sotto le platee di fondazione al fine di assicurare lo smaltimento delle acque e garantire la stabilità e la salubrità della palestra;

- provvedere all'utilizzo di idoneo ponteggio per l'armatura ed il getto delle strutture di copertura della palestra, vista la necessità di provvedere al contempo al dovuto puntellamento delle strutture in quota orizzontali, verticali ed inclinate, facendo così seguito a quanto richiesto dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Geom. Riccardo Balzoni;

- la riprogettazione degli spogliatoi e la revisione totale degli impianti elettrico e meccanici perché alcune modifiche introdotte nell'adiacente Scuola media hanno determinato la necessità di rivedere il progetto della palestra;

- adeguare il progetto strutturale alle nuove NTC 2018, non in vigore al momento della stesura e dell'approvazione del progetto originario, a seguito delle richieste di integrazioni da parte dell'ufficio regionale del Genio civile di Siena;

Dato atto che:

- il computo delle opere dettagliate nella perizia di variante n. 2, ed in particolare nella relazione tecnica, redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006 per lavori in variante riferiti alle motivazioni di cui c. 1 lett. a), c.1 lett. b) e c. 1 lett. c) del medesimo articolo, determina un incremento netto, a seguito dell'applicazione dello sconto offerto dall'impresa

in sede di aggiudicazione di 24,765 %, pari ad € 4.865,06 oltre maggiori oneri della sicurezza per € 54.631,20 per la somma di € 59.496,26 oltre IVA, così per un importo totale, comprensivo di IVA, pari ad € 65.445,88;

- l'impresa affidataria dei lavori, Impresa Edile D'Angeli Renato, ha sottoscritto i documenti relativi alle opere aggiuntive previste dalla perizia di variante n.2 e provvederà a stipulare con l'Amministrazione Comunale l'atto di sottomissione, di cui allo schema approvato con la seguente deliberazione, per l'importo complessivo di € 65.445,88 oltre IVA;

Considerato che, per quanto sopra, si rende necessario procedere ad:

a) approvare la suddetta proposta di perizia di variante n. 2 presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Passaniti;

b) approvare il Quadro Economico – Piano dei Costi della Nuova Palestra del capoluogo, rideterminato dal RUP del procedimento, Arch. Alberto Sardelli, alla luce di questa perizia di variante n. 2 , dando atto che esso presenta le risorse necessarie alla copertura delle maggiori spese (in allegato al presente atto sotto la lettera “B”, a formarne sua parte integrante e sostanziale);

Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto è l'Arch. Alberto Sardelli, a seguito di atto di nomina del Segretario Comunale prot n. 22398 del 3.11.2016;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la proposta di perizia di variante n. 2 per i lavori di “Realizzazione della Nuova Palestra di San Gimignano”, presentata dal Direttore dei lavori Ing. Giovanni Passaniti, ns. prot. n. 8975 del 03/05/2019, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Computo metrico estimativo;
- Computo metrico degli extra oneri della sicurezza;
- Quadro di Raffronto;
- Quadro Economico di Variante;
- Quadro Economico di raffronto;
- Schema di Atto di sottomissione;
- Verbale nuovi prezzi;
- Ar-01 Pianta Quota – 8.00 Stato di Progetto;
- Ar-02 Pianta Quota – 4.00 Stato di Progetto;
- Ar-03 Pianta Piano terreno Stato di Progetto;
- Ar-04 Sezioni Stato di Progetto;
- Ar-05 Alzati Stato di Progetto;
- IM-01 Impianto Aeraulico -Pianta;
- IM-02 Impianto Aeraulico -Sezioni;
- IM-03 Impianto Riscaldamento Spogliatoi;
- IM-04 Impianto Distribuzione Acqua Calda Sanitaria;
- IE -01 Pianta piano quota – 8.00 Impianti elettrici e speciali;
- IE -02 04 Schemi elettrici dei quadri;
- ST.01 int02 strutture in c.a. spogliatoi var. 02 piante p.int. e copertura;
- ST.02 int02 strutture in c.a. spogliatoi var. 02 armature setti – pilastri- travi;

- ST.03 int02 strutture in c.a. palestra- sezione A-A;
- Relazione di calcolo palestra;
- Relazione di calcolo spogliatoi;

2. di precisare che gli elaborati di cui al precedente punto 1. rimangono conservati in atti ad eccezione della relazione tecnica che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A";

3. di dare atto che a seguito dell'approvazione della suddetta perizia è stata accordata all'impresa una proroga di 60 gg per l'esecuzione dei lavori;

4. di approvare il Quadro Economico – Piano dei Costi della Nuova Palestra del capoluogo, rideterminato dal RUP del procedimento, Arch. Alberto Sardelli, alla luce di questa perizia di variante n. 2 , dando atto che esso presenta le risorse necessarie alla copertura delle maggiori spese (in allegato al presente atto sotto la lettera "B", a formarne sua parte integrante e sostanziale);


5. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e L.L.P.P. Arch. Alberto Sardelli di adottare tutti i provvedimenti necessari a dare esecuzione a quanto disposto dal presente atto;

6. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
BASSI GIACOMO

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

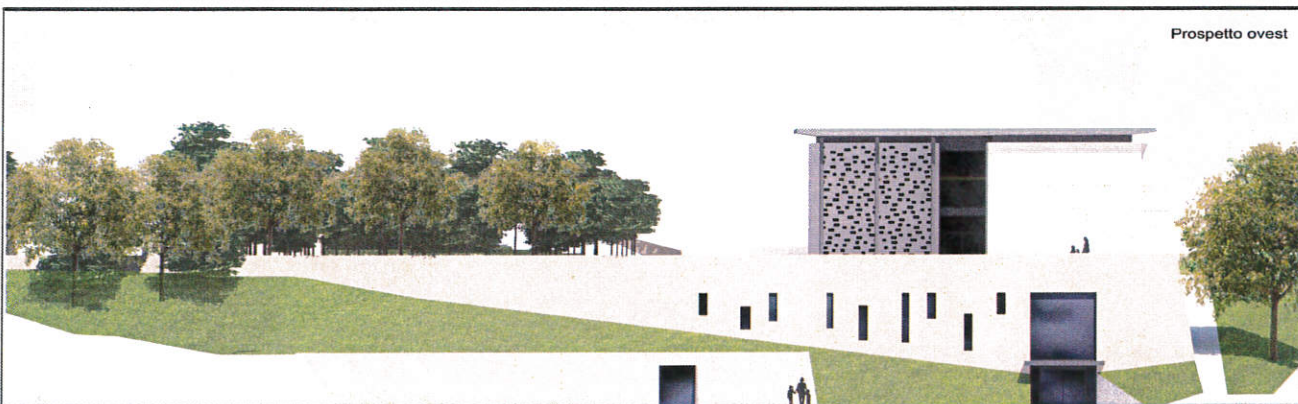

COMUNE di San Gimignano

NUOVA PALESTRA DI SAN GIMIGNANO

Riqualificazione urbana dell'area per
attrezzature e servizi pubblici (AP)
lungo via Delfo Giachi
VARIANTE N°2

elaborato	oggetto	scala
1	Relazione Generale	

COMMITTENTE	Comune di San Gimignano
-------------	--------------------------------

PROGETTISTI	Ing. Giovanni Passaniti Arch. Laura Bati Arch. Monica Bati Per. Ind. Matteo Peluso Per. Ind. Gianni Ulivi
-------------	--



Studio Tecnico Associato
 ARCHITETTURA - INGEGNERIA
 IMPIANTISTICA - CONSULENZE
 Via Aretina 2/g 50065 Pontassieve (FI) tel. 055 8367114
 Fax 055 8367174 - e-mail: info@stapontassieve.net



OGGETTO: NUOVA PALESTRA DEL CAPOLUOGO. SECONDA PERIZIA DI VARIANTE.

Come da richiesta di autorizzazione inoltrata via PEC in data 25 gennaio u.s., autorizzazione ricevuta sempre via PEC in data 29 gennaio dal RUP Arch. Alberto Sardelli, questa seconda perizia di variante suppletiva si è resa necessaria a seguito di condizioni non previste e non prevedibili al momento della stesura del progetto e quindi riconducibili all'art. 132 "Varianti in corso d'opera" del DLgs 163/2006, che regola il contratto d'appalto delle opere in questione e riferendosi ai seguenti commi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale.

In particolare:

- 1) si è ritenuto indispensabile la formazione di un sistema di drenaggio composto sia da alcuni "rami" di trincee drenanti che dalla formazione di uno strato di materiale arido (di circa 15 cm) da disporre sotto le platee di fondazione al fine di assicurare lo smaltimento delle acque e garantire, pertanto, la stabilità e la salubrità futura della palestra. Dai sondaggi geognostici propedeutici al progetto non risultava la presenza di acqua ad una quota che potesse interagire con il sistema fondale, durante gli scavi sono state invece rinvenute continue venute di acqua che hanno reso indispensabile quanto sopra descritto;
- 2) Facendo seguito a quanto richiesto dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Geom. Riccardo Balzoni, di provvedere all'utilizzo di idoneo ponteggio per l'armatura ed il getto delle strutture di copertura della palestra, vista la necessità di provvedere al contempo al dovuto puntellamento delle strutture in quota orizzontali, verticali ed inclinate, si è ritenuto indispensabile che la Ditta esecutrice provvedesse in tal senso fornendo tra l'altro il progetto ed il calcolo delle strutture provvisori;
- 3) Le modifiche introdotte nella adiacente Scuola media hanno determinato la necessità di rivedere anche il progetto della palestra ed in particolare lo spostamento della stessa scuola ha fatto sì che gli spogliatoi così come previsti risultavano interferire sia con il percorso di accesso alle strutture che con i locali tecnici a servizio del palazzetto esistente, è stato necessario pertanto riprogettare gli spogliatoi, così come si è resa indispensabile la revisione totale degli impianti elettrico e meccanico sia per la modifica degli spogliatoi sia

perché le predisposizioni nella scuola media degli impianti a servizio della palestra sono state realizzate diversamente da quanto progettato inizialmente.

4) A seguito delle richieste di integrazioni da parte dell'ufficio regionale del Genio civile di Siena si è convenuto con l'amministrazione come fosse opportuno adeguare il progetto strutturale alle nuove NTC 2018 non in vigore al momento della stesura e della approvazione del progetto originario. Ciò ha comportato, tra l'altro, un incremento delle armature necessarie per rendere il progetto rispondente ai dettami di tale normativa.

NUOVA PALESTRA DI SAN GIMIGNANO

*** QUADRO ECONOMICO GENERALE ***

Voce	Descrizione	Q.E. RIMODULATO POST GARA			PERIZIA VARIANTE N I			perizia variante n.2		
		TOTALE	MIUR	COMUNE	TOTALE	MIUR	COMUNE	TOTALE	MIUR	COMUNE
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso 8al netto del ribasso del 24,765%)	651.447,10	557.544,82	93.902,28	741.736,72	572.975,12	168.761,60	746.601,78	572.975,12	173.626,66
A.2	Costo mano d'opera non soggetta a ribasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	40.489,95	34.653,56	5.836,39	48.763,15	34.653,56	14.109,59	103.394,35	34.653,56	68.740,79
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.1	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA 10%	7.349,55	6.290,16	1.059,39	7.349,55	6.290,16	1.059,39	141.484,37	6.290,16	135.194,21
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizza di rifiuti speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.6	Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 codice appalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	40.000,00	34.234,23	5.765,77	75.270,06	34.234,23	41.035,83	91.839,62	34.234,23	57.605,39
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art.92 D.Lgs 163/2006	18.029,09	15.430,30	2.598,79	18.029,09	0,00	18.029,09	0,00	0,00	0,00
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.10	Spese di cui agli artt. 90 commi 3 e 4 e 92 comma 7bis del Codice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.5	Spese per pubblicità + IVA	0,00	0,00	0,00	1.593,96	0,00	1.593,96	1.593,96	0,00	1.593,96
B.6	IVA al 10% sui lavori	69.193,71	59.219,84	9.973,87	79.049,99	59.219,84	19.830,15	84.999,61	59.219,84	25.779,77
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche	10.752,00	9.202,16	1.549,84	19.244,53	9.202,16	10.042,37	23.698,43	9.202,16	14.496,27
B.8	Tassa Autorità di vigilanza LLPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	0,00	0,00	0,00	1.901,04	0,00	1.901,04	1.901,04	0,00	1.901,04
B.10	Acquisto di beni comprensivo di IVA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
B.11	Spese organizzative gestionali	0,00	0,00	0,00	806,84	0,00	806,84	806,84	0,00	806,84
TOTALE GENERALE		837.261,40	716.575,07	120.686,33	1.013.744,93	716.575,07	297.169,86	1.236.320,00	716.575,07	519.744,93



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO NUOVO VILLAGGIO SCOLASTICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 501/2019 del SERVIZIO NUOVO VILLAGGIO SCOLASTICO ad oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI SAN GIMIGNANO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - CIG 637199509F - CUP C27B14000120004 si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

14/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(SARDELLI ALBERTO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 501/2019 ad oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI SAN GIMIGNANO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - CIG 637199509F - CUP C27B14000120004 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

14/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 92 del 14/05/2019

NUOVO VILLAGGIO SCOLASTICO

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI SAN GIMIGNANO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - CIG 637199509F - CUP C27B14000120004.

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 16/05/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 92 del 14/05/2019

NUOVO VILLAGGIO SCOLASTICO

**Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI SAN GIMIGNANO -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - CIG 637199509F - CUP
C27B14000120004.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/05/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 92 del 14/05/2019

**Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DI SAN GIMIGNANO -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - CIG 637199509F - CUP
C27B14000120004.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 16/05/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 12/06/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
